

Spett. Comune di
CHALLAND SAINT ANSELME
Alla c.a. del RUP Geom. L. Grivon
Fraz. Quinçod
11020 CHALLAND SAINT ANSELME (AO)

Challand Saint Anselme, 18/10/2021

OGGETTO: ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO SCUOLA MATERNA SCUOLA ELEMENTARE SEDE COMUNALE ED ALTRI SERVIZI CUP: J77C18002030001 ; CIG: 8546154D5F- relazione mensile sullo stato di avanzamento dei lavori - 07 -



Prospetto lungo la SR 45



Fermata Autobus SR 45

In riferimento alla Vs del 15/03/2021 prot. 1354 VI-5, si espone quanto segue:

RELAZIONE MENSILE SULLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI -07-

Il processo verbale di consegna lavori è stato sottoscritto il **18.03.2021** il tempo utile per dare compiuta l'opera stabilito nel contratto è di **gg. 540** e conseguentemente l'ultimazione degli stessi dovrà avvenire entro **l'8 settembre 2022**. Dalla consegna dei lavori a tutto il 18 settembre sono trascorsi **215 gg.**

Sono presenti in cantiere da 4 a 5 maestranze oltre all'assistente tecnico dell'impresa

Lavorazioni svolte:

- demolizioni delle parti in conglomerato cementizio armato:
 - ammorsamento per muratura uff. postale;
 - ammorsamento per rampa scale
- realizzazione ponteggi su prospetti corpo scuola d'infanzia;
- rimozione copertura tetto corpo scuola d'infanzia;
- completamento sino ad ultimo tavolato ligneo del tetto della maison communale;
- rimozione delle macerie con cernita delle frazioni riciclabili;
- trasporto e smaltimento delle macerie in discarica autorizzata;
- stoccaggio materiale da costruzione:
 - pannelli isolanti;

- barriera al vapore;
- tavolami lignei;
- blocchi in laterizio;
- barre in acciaio da armatura.


- casserature per costruzione murature:




Copertura tetto maison communale



Copertura tetto maison communale

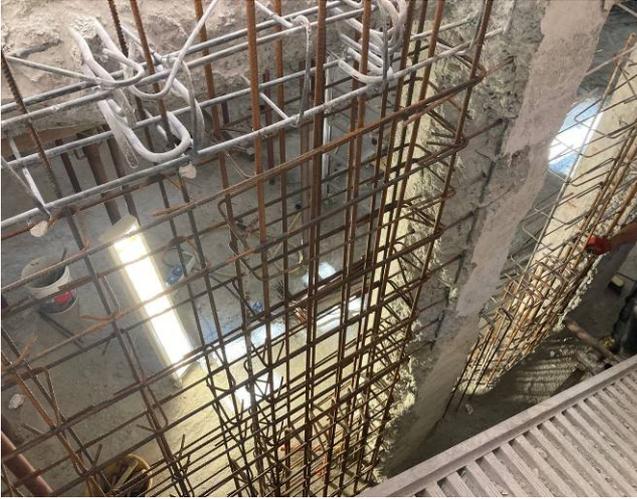

Costruzione muratura in ca locali posta

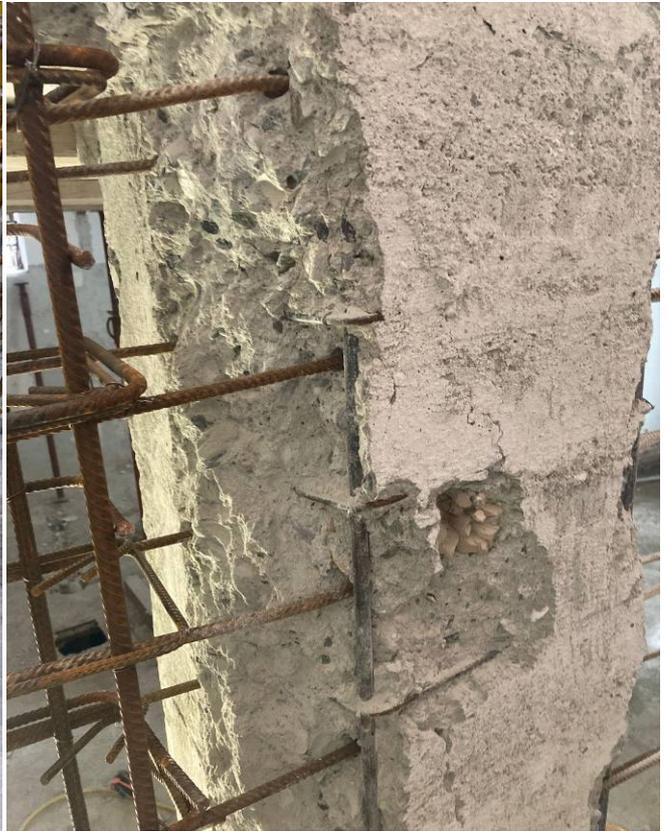

Costruzione muratura in ca locali posta



Armatura scala e base ascensore



Le attività di cantiere sono state svolte regolarmente
