

Spett. Comune di
CHALLAND SAINT ANSELME
Alla c.a. del RUP Geom. L. Grivon
Fraz. Quinçod
11020 CHALLAND SAINT ANSELME (AO)

Challand Saint Anselme, 18/11/2021

OGGETTO: ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO SCUOLA MATERNA SCUOLA ELEMENTARE SEDE COMUNALE ED ALTRI SERVIZI CUP: J77C18002030001 ; CIG: 8546154D5F– relazione mensile sullo stato di avanzamento dei lavori – 08 –



Prospetto lungo la SR 45



Prospetto laterale SC Pésan Orbeillaz

In riferimento alla Vs del 15/03/2021 prot. 1354 VI-5, si espone quanto segue:

RELAZIONE MENSILE SULLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI -08-

Il processo verbale di consegna lavori è stato sottoscritto il **18.03.2021** il tempo utile per dare compiuta l'opera stabilito nel contratto è di **gg. 540** e conseguentemente l'ultimazione degli stessi dovrà avvenire entro **l'8 settembre 2022**. Dalla consegna dei lavori a tutto il 18 novembre sono trascorsi **246 gg.**

E' stato compilato il SAL 01 a tutto il 17/11/2021

Sono presenti in cantiere da 10 a 12 maestranze oltre all'assistenti tecnici dell'impresa

Lavorazioni svolte:

- demolizioni delle parti in conglomerato cementizio armato;
- ammorsamenti solai pilastri e murature;
- rimozione delle macerie con cernita delle frazioni riciclabili;
- trasporto e smaltimento delle macerie in discarica autorizzata;
- cassetture ed armature per getti di pilastri travi muri;
- opere di consolidamento e rinforzo solaio basso corpo (scuole)
- predisposizione strutture per pareti divisorie in cartongesso



Ammorsamenti carpenterie




Ammorsamenti carpenterie



Opere di rinforzo solaio del basso corpo



Opere di rinforzo solaio del basso corpo

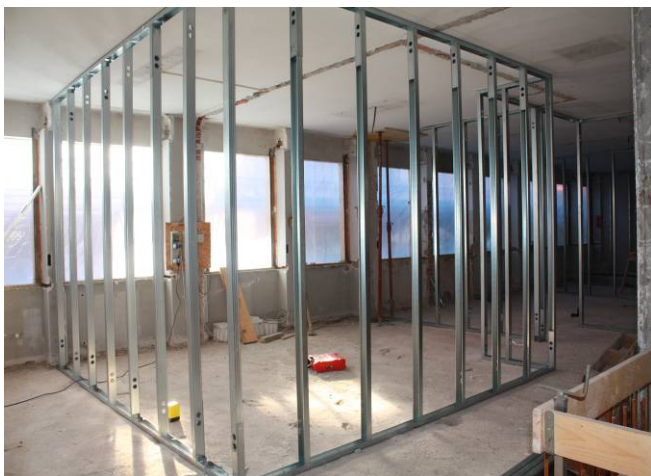

Predisposizione strutture per pareti divisorie

Le attività di cantiere sono state svolte regolarmente
