

Spett. Comune di
CHALLAND SAINT ANSELME
Alla c.a. del RUP Geom. L. Grivon
Fraz. Quinçod
11020 CHALLAND SAINT ANSELME (AO)

Challand Saint Anselme, 18/12/2021

OGGETTO: ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO SCUOLA MATERNA SCUOLA ELEMENTARE SEDE COMUNALE ED ALTRI SERVIZI CUP: J77C18002030001 ; CIG: 8546154D5F- relazione mensile sullo stato di avanzamento dei lavori - 09 -



Prospetto lungo la SR 45



Prospetto laterale SC Pésan Orbeillaz

In riferimento alla Vs del 15/03/2021 prot. 1354 VI-5, si espone quanto segue:

RELAZIONE MENSILE SULLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI -09-

Il processo verbale di consegna lavori è stato sottoscritto il 18.03.2021 il tempo utile per dare compiuta l'opera stabilito nel contratto è di **540 gg.** e conseguentemente l'ultimazione degli stessi dovrà avvenire entro l'8 settembre 2022. Dalla consegna dei lavori a tutto il 18 dicembre sono trascorsi 276 gg.

E' stato compilato il SAL 01 a tutto il 17/11/2021

L'Impresa effettuerà una sospensione dei lavori in occasione delle festività dal 24/12/2021 al 09/01/2021.

Sono presenti in cantiere da 9 a 13 maestranze oltre all'assistenti tecnici dell'impresa

Lavorazioni svolte:

- demolizioni delle parti in conglomerato cementizio armato vano ascensore;
- ammorsamenti solai pilastri e murature;
- rimozione delle macerie con cernita delle frazioni riciclabili;
- trasporto e smaltimento delle macerie in discarica autorizzata;
- casserature ed armature per getti di pilastri travi muri;
- opere di riconsolidamento e rinforzo pilastri e solai



Casserature ed ammassamenti



Nuova trave in ca piano interrato



Fiorettatura inghisaggio delle riprese




Nuovo vano ascensore n ca



Rinforzo solaio con putrella in acciaio



Nuova trave in ca a spessore

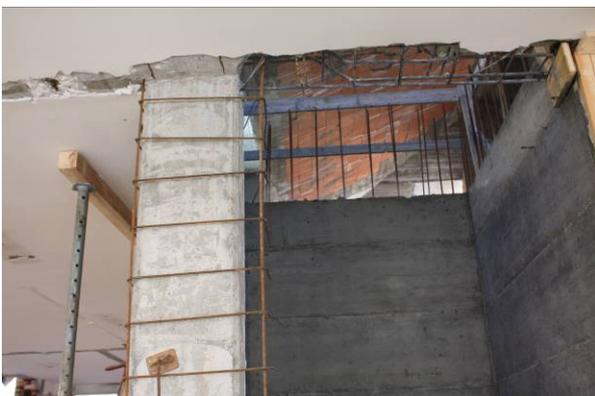

Rinforzo del pilastro



Inghisaggi e rinforzi



Predisposizione nuovo pilastro in ca



Demolizione vano ascensore



Casseratura scala di servizio



Demolizione struttura in ca



Demolizioni e rinforzi



Nuovo pilastro in ca
